


工建たより 2023年 神無月号



あっという間に10月です！
まだまだ日中は暑い日がありますが朝夕は過ごしやすくなってきましたね。
寒暖差が激しいので体調を崩さないように気を付けましょうね。
さて、今月の工建たよりは引き続き四日市市尾平町・増改築工事の模様をご紹介します。
どうぞご覧ください。



四日市市尾平町 増改築工事①



着々と工事が進んでいます。
まだまだ暑い中、職人さんたちは頑張ってます！
今号では基礎工事からの模様をご紹介します。



≪ 基礎工事① ≫

丁張を行い掘削後、砕石を打設し、防水シートを敷設します。



捨てコンクリートを打設します。




コンクリートが乾いたら型枠を設置し、鉄筋を組んでいきます。



≪ 給排水管工事① ≫

基礎工事と並行して給排水管工事も進めます。新たに給排水管を設置し、既設の配管に繋げていきます。

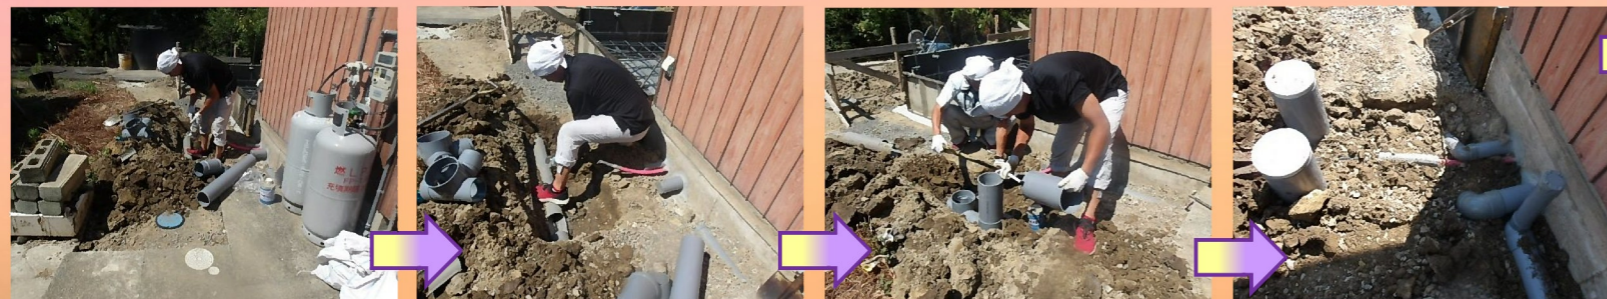

土間の生コン打設前に給排水管を設置します。



四日市市尾平町
増改築工事②



≪ 基礎工事② ≫




生コンを一輪車で運び、土間を打設していきます。



コテ押さえを行い、土間打設完了です。2～3日の養生期間後、立上り部分の打設になります。



型枠をばらして立ち上がり部の角をサンダーで削ってを整え、基礎周りに一時撤去していた土を戻して工事完了です。

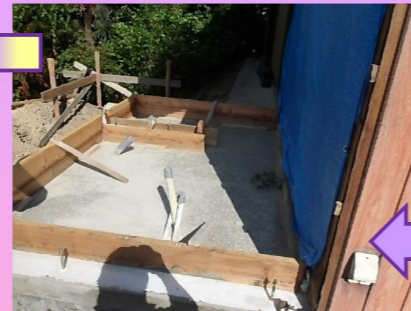


生コンを打設していきます。



土間が乾いたら立上り部分の型枠を組んでいきます。

≪ 墨付け&刻み加工 ≫

工場では墨付け&刻み加工が進みます。 図面を基に躯体材に寸法や仕口形状を墨付けし、その後刻み加工を行っていきます。

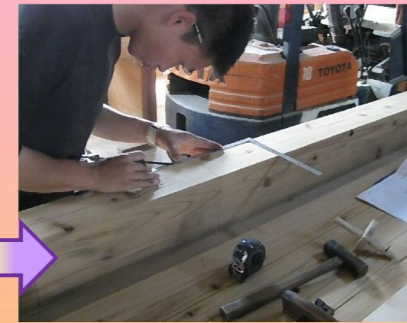


刻み加工が終わったら仮組ををしてぴったり納まるように微調整を行います。




四日市市尾平町 増改築工事③



≪ 大工工事① ≫

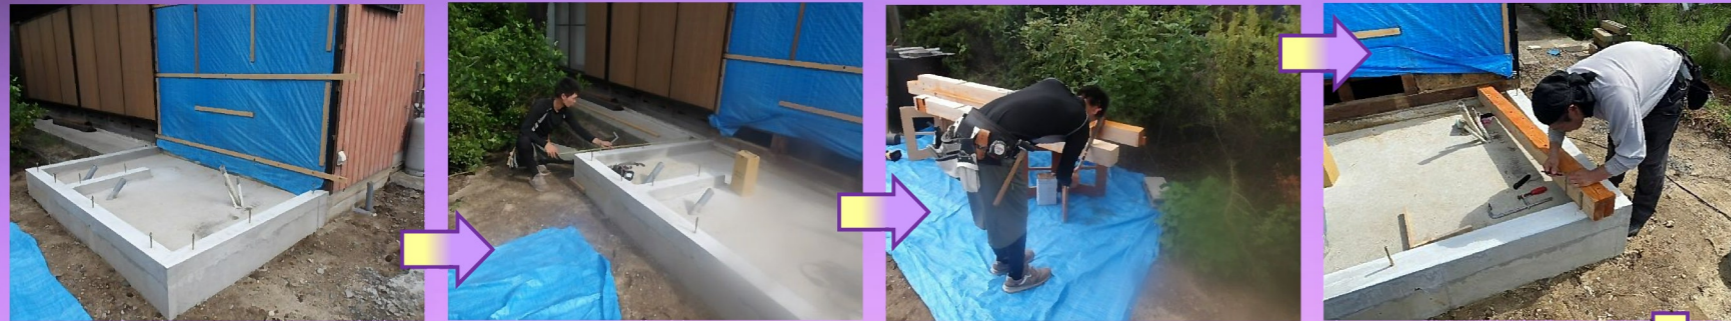

基礎の養生期間が終わり、土台敷きを行います。

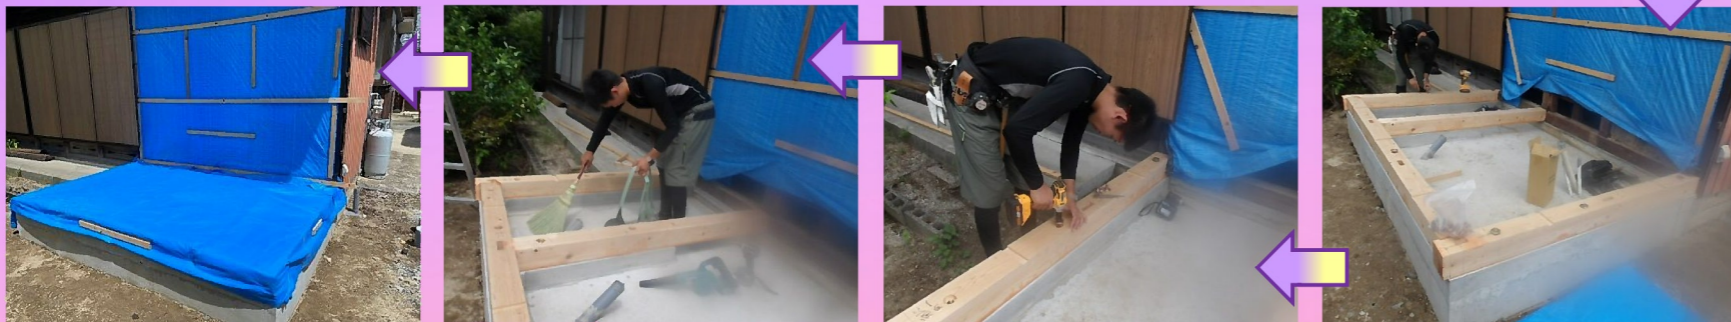

掃除を行いブルーシート養生をしておきます。

運び込んが躯体材の微調整を行いながら土台を組んでいきます。

≪ 建前① ≫

建前です！お天気にも恵まれました！
養生のブルーシートを撤去して準備していきます。



増築部分に張り出している軒先を撤去していきます。



最初の柱を社長が建て、その後次々に柱が建てられていきます。

慎重に切断していきます。



建前の模様は次ページに続きます～♪



≪ 給排水管工事② ≫



土台敷きが終わり、建前までの間に配管工事を行います。
基礎打設前に仕込んでおいた空管を実管に繋げます。



埋設管の為の掘削を行い、増築部分の浴室と洗面所の排水管を既設排水管へ
繋いでいきます。



≪ 足場設置&瓦撤去 ≫



鋼管を運び込み、足場を組み上げていきます。



既存瓦の一部を撤去し、保管していきます。



四日市市尾平町
増改築工事④



≪ 建前② ≫



小屋束を建てる為のホゾ穴を掘っていきます。



屋根にルーフィングを敷いて…

梁や桁をお様ながら下げ降りで寝起きの確認を行います。




小屋束に防水テープを貼って雨を防ぎます。

小屋束を建て、傾きがないか水平器で確認します。



母屋を仮置きし、建前当日の工事はここまでです。

≪ 電気工事 ≫

屋内では電気工事が進められます。
トイレを移設するので、移設場所の仕込み配線を行います。

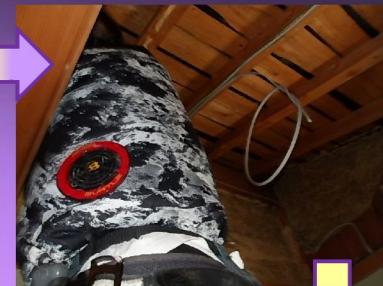

≪ 大工工事 ≫

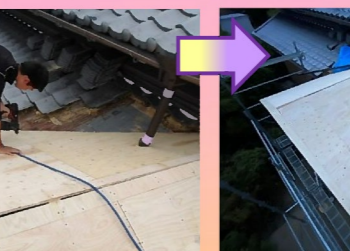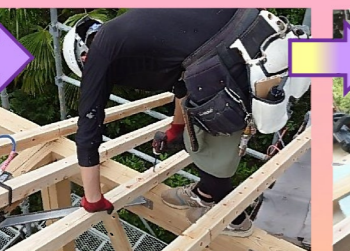

野地板を貼っていきます。

屋根が出来上がりました(ˊ)v

垂木を取り付けていきます。屋根のかたちが出来上がっていきます。



浴室と洗面所にサッシを取り付け、断熱材を充填していきます。

ダイライトを貼り、金物を取り付けていきます。

～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

