


# 工建たより 2019年葉月号



8月です！子供たちは夏休みですね(〇)  
 去年は連日の酷暑で体力が奪われバテバテでしたが、今年は今のところ耐えられる暑さですね。  
 暑いことには変わりありませんが、去年の暑さと比べたら涼しく感じてしまいます(・・・;)   
 しかし、これからが夏本番です！熱中症や食中毒に気をつけてこの夏を乗り切りましょう。

さて、今月の工建たよりは引き続き、四日市市中町・トリビュートホームWB新築工事と  
 新たにご依頼のありました四日市市青葉町・水回り&内装建具改修工事の模様をご紹介します。  
 どうぞご覧ください～い\(^o^)/

## 四日市市中町 トリビュートホーム WB新築工事



着々と工事は進んでいます。  
 各部屋の形がだんだんと出来上がってきています。  
 施主様に現場までお越しいただき、照明器具やコンセント、スイッチ等の位置確認を行いました。

### 《 造作工事 》



現場に運び込まれた断熱材を壁にはめ込むサイズに加工しながら一枚ずつ充填していきます。



綺麗に納まりました(^\_^)v  
 床の断熱材を充填した時と同じように断熱材が浮いてこないように木枠で押えていきます。

### 《 上部躯体完了検査 》

社長と設計士立ち会いのもと、第三者機関の検査員による上部躯体検査を受けました。  
 図面との整合性を細かくチェックしていきます。



検査に合格しなければ  
 次の工程へ進めませんが、問題なく合格をいただくことができました！  
 (^\_^)v

### 《 電気設備位置確認打ち合わせ 》

施主様に現場までお越しいただき、照明器具、スイッチ、コンセントの位置確認を行いました。  
 スイッチやコンセントの位置を分かりやすくする為に、事前にプレートを貼り付けてあります。



このようなプレートです(^\_^)



家具の配置や生活していくことをイメージしながらスイッチやコンセントの位置を確認しました。

続きは次号で  
 ご紹介します！  
 お楽しみに～♪





# 四日市市青葉町 水回り& 内装建具改修工事



浴室、洗面所、トイレ、内装建具の改修工事のご依頼をいただきました。  
既存の浴室は湿式タイル仕上げでしたがシステムバスに変更し、洗面所は床が少し浮ついてきたので全面解体し、洗面化粧台を新しくします。トイレはカウンター付の手洗器を取り付け、節水型の洋式便器に取り替えます。




## 《 工事前 》



浴室



洗面所

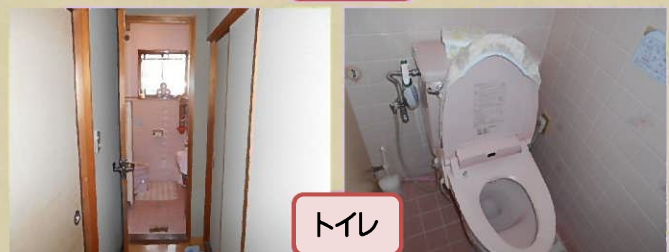

トイレ



洗面所・片引戸

リビング・片引戸

今回の工事では設備を入れ替えるだけの工事と違い、解体して作り直すので少し大がかりな工事となります。浴室と洗面所の工事は約3週間、トイレ工事は約2週間の工程予定になります。お施主様ご家族にはしばらくの間、ご不便をおかけします(+\_+)



## 《 工事前養生 》

工事にかかる前に床、壁、建具枠にキズや汚れが付かないようにブルーシートや養生板などできっちり養生をしておきます。



## 《 浴室&洗面所解体工事 》

撤去した部材を慎重に運び出していきます。



既存の柱や壁を確認しながら慎重に撤去していきます。

撤去後、清掃を行い解体工事完了です



## 《 給排水工事 》

解体にともない、新たに給排水仕込み配管を施工していきます。



## 《 造作工事 》



防蟻剤を塗布します。




天井、壁、床に断熱材を充填していきます。



下地用の木桟を取り付けます。



石膏ボードを貼って、大工工事は一旦終了です。



完成した模様は次号でご紹介します！  
お楽しみに〜♪

新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修などをご検討されている方、お気軽にお問い合わせ下さい！



0800-2002807

通話料無料  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます

<http://www.m-kouken.com>



水谷工建

有限会社
